

DICTAMEN

PARA FUNDAMENTAR LA CELEBRACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021

Dictamen que servirá de base para determinar el fallo y el nombre del licitante ganador de la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021, relativa a la Obra Pública: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS CUERPO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44229); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y TEPACHE CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44390) Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44420).; de acuerdo a la Convocatoria Múltiple E5, publicada el día 17 de junio de 2021, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, formulado por la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos de la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) del H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, con motivo del análisis y evaluación de las propuestas presentadas por las empresas participantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN

Los criterios utilizados en la elaboración del presente dictamen para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato respectivo, son aquellos establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y artículos 62, 63, 64 y 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; así como los incisos H.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES e I.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, de las Bases de la presente Licitación.

RESEÑA CRONOLÓGICA

- 1.- Con fecha 17 de junio del 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y en las páginas de Internet: http://www.hermosillo.gob.mx/portalthransparencia/licitaciones_publicas.aspx y <http://tuobra.hermosillo.gob.mx>, la Convocatoria Múltiple E5, para la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021, con la finalidad de adjudicar el contrato de la Obra Pública denominada: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS CUERPO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44229); PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y TEPACHE CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44390) Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA (FOLIO MIDS 44420).
- 2.- Con fecha 24 de junio del 2021, a las 10:00 horas, se llevó a cabo la visita al sitio de los trabajos, partiendo de las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el segundo piso del edificio que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora, con la finalidad que los interesados en participar en esta licitación conocieran el lugar donde se construirá la obra.
- 3.- El 25 de junio del 2021, a las 09:00 horas, se llevó a cabo la junta de aclaraciones en la sala de juntas de la Coordinación General de CIDUE, ubicada en el segundo piso del edificio que ocupa la CIDUE, sito en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, Hermosillo, Sonora.
- 4.- Con fecha 25 de junio del 2021, a las 14:30 horas, se cerró el periodo de venta de bases de licitación, realizando el pago de las mismas 3 empresas: 1) OTATE SS, S.A. DE C.V.; 2) GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.; y 3) MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.
- 5.- Con fecha 02 de julio del 2021, a las 09:00 horas, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que se presentaron y se recibieron de las empresas concursantes los sobres cerrados conteniendo sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta a la técnica y económica. Dicho acto se llevó a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de CIDUE, procediendo a la apertura de los sobres de cada empresa participante, analizándose de manera cuantitativa el total de la documentación presentada, dándose lectura al importe total de cada una de las propuestas aceptadas, procediendo el servidor público que presidió el acto y un licitante a rubricar en todas sus fojas el Documento No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, donde se consignan los precios y el importe total de la propuesta, de aquellas que fueron aceptadas para su revisión detallada, obteniéndose el siguiente resultado:



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN DETALLADA

No.	CONTRATISTA	PROPUESTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)
1	MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	ACEPTADA	2'457,128.67
2	OTATE SS, S.A. DE C.V.	ACEPTADA	2'727,751.03
3	GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.	ACEPTADA	2'213,564.91

6.- Una vez realizada la evaluación detallada de las proposiciones aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

6.A.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.:

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		

Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right.



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		
DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

3 / 9



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✉		
DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

6.B.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa OTATE SS, S.A. DE C.V.:

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		
DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✓		
DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

6.C.- Ficha de revisión detallada de la propuesta de la empresa GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.:

PROPUESTA TÉCNICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 1.- MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, Y OTRAS CONSIDERACIONES	✓		
DOCUMENTO No. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	✓		
DOCUMENTO No. 3.- CURRICULA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICO.	✓		
DOCUMENTO No. 4.- ACREDITAMIENTO DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	✓		
DOCUMENTO No. 5.- ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE.	✓		
DOCUMENTO No. 6.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 7.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y DETERMINACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE DISPONIBLE NO COMPROMETIDO.	✓		
DOCUMENTO No. 8.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	✓		
DOCUMENTO No. 9.- PROGRAMAS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		

PROPUESTA ECONÓMICA:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 10.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO.	✓		
DOCUMENTO No. 11.- CARTA COMPROMISO.	✓		



DOCUMENTO No. 12.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y BÁSICOS O AUXILIARES.	✓		
DOCUMENTO No. 13.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQ. Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 14.- LISTADO DE INSUMOS.	✓		
DOCUMENTO No. 15.- DATOS BÁSICOS DE COSTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 16.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FSR Y TABULADOR DE SALARIOS.	✓		
DOCUMENTO No. 17.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓		
DOCUMENTO No. 18.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO.	✓		
DOCUMENTO No. 19.- CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.	✓		
DOCUMENTO No. 20.- PROG. CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MONTOS MENSUALES.	✓		
DOCUMENTO No. 21.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 22.- PROG. CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓		
DOCUMENTO No. 23.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.	✓		
DOCUMENTO No. 24.- PROG. CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADTVO. ENCARGADO DE LA DIR., ADMON. DE LOS TRABAJOS.	✓		
DOCUMENTO No. 25.- PROPUESTA DIGITAL.	✓		

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN DISTINTOS A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
DOCUMENTO No. 26.- MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 27.- MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 Y 118 DE LA "LEY".	✓		
DOCUMENTO No. 28.- IDENTIFICACIÓN.	✓		
DOCUMENTO No. 29.- ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD.	✓		



COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



DOCUMENTO No. 30.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	✓		
DOCUMENTO No. 31.- CONVENIO PRIVADO PARA PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES.	✓		
DOCUMENTO No. 32.- CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS NI LITIGIOS PENDIENTES.	✓		
DOCUMENTO No. 33.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	✓		
DOCUMENTO No. 34.- CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	✓		
DOCUMENTO No. 35.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	✓		

7.- Una vez realizada la evaluación detallada de las propuestas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación que nos ocupa, se determina lo siguiente:


RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS POR LAS CUALES SE ACEPTAN O DESECHAN LAS PROPOSICIONES:

- 7.1.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.
- 7.2.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **OTATE SS, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.
- 7.3.- Se **ACEPTA** la propuesta de la empresa **GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.** por considerarse técnica y económicamente solvente.

8.- Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicara el contrato, en base al Artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, CIDUE obtuvo previamente un presupuesto de referencia, el cual resulta del promedio del total de las proposiciones aceptadas como solventes, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores a dicho presupuesto de referencia y aquellas cuyo monto sea inferior en más del 10% (diez por ciento) con relación a dicho presupuesto de referencia, obteniéndose el siguiente resultado:

No.	CONTRATISTA	IMPORTE (En \$ y sin I.V.A.)	PRESUPUESTO DE REFERENCIA (En \$ y sin I.V.A.)	-10 %	RESOLUCIÓN
1	OTATE SS, S.A. DE C.V.	2'727,751.03	2'466,148.20	2'219,533.38	Descalificada, por presentar un monto superior al presupuesto de referencia.
2	MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	2'457,128.67			Aceptado, por presentar un monto dentro del rango del presupuesto de referencia y un 10% menor a él.
3	GM SUPERPAVE, S.A. DE C.V.	2'213,564.91			Descalificada, por presentar un monto inferior en más del 10% con relación al presupuesto de referencia.

En este caso resulto una sola propuesta solvente, dentro del rango del presupuesto de referencia y un 10% menor a él, por lo que no procede aplicar el orden de prelación establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

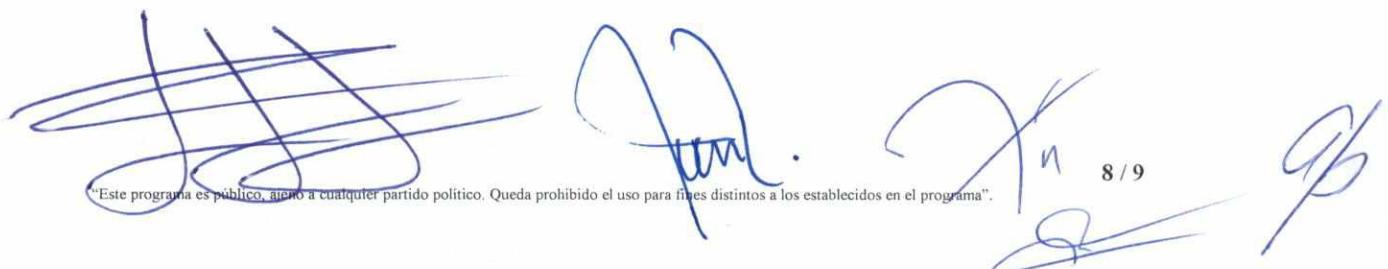

9.- Dictamen de la revisión detallada:

DICTAMEN

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CIDUE DICTAMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA MURRIETA SOLUCIONES, S.A. DE C.V. ES LA ÚNICA PROPUESTA TÉCNICAMENTE Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO, REUNIENDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NOS OCUPA, CON UN MONTO DE \$ 2'457,128.67 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 67/100 M.N.), SIN INCLUIR EL I.V.A., POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO.

Lo anterior se corrobora con el análisis detallado de las proposiciones técnicas y económicas aceptadas para ello y en la tabla comparativa de precios unitarios que se adjunta al presente como ANEXO 1, formando parte integral del dictamen en que se actúa.

Se emite el presente Dictamen para que sirva como base para determinar el fallo y el nombre del licitante ganador de la Licitación Pública Estatal No. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y a lo estipulado en las Bases de la Licitación, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 08 de julio 2021.


POR CIDUE:

AUTORIZÓ:




ARQ. JOSÉ E. CARRILLO ATONDO
COORDINADOR GENERAL

VO.BO.:

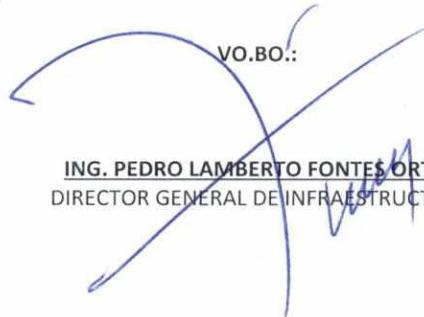


ING. PEDRO LAMBERTO FONTES ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISÓ:



ING. JUAN ROMERO LOYA
SUBDIRECTOR DE COSTOS, LICITACIONES
Y CONTRATOS

ELABORÓ:

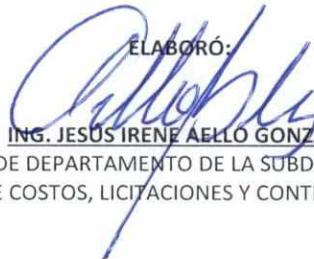

ING. JESÚS IRENE AELLO GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION
DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS



Licitación No. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021

NOMBRE DE LA OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre San Pedro y Divisaderos cuerpo poniente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (Folio MIDS 44229); Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre San Pedro y Tepache cuerpo oriente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (Folio MIDS 44390) y Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre Tepache y Divisaderos cuerpo oriente, en la ciudad de Hermosillo.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	\$2,464,144.06		\$2,457,128.67		\$2,727,751.03		\$2,213,564.91	
				P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE		
PRELIMINARES											
44228 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE SAN PEDRO Y DIVISADEROS CUERPO PONIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.											
PRELIMINARES											
PAV010	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL	M2	572.05	10.15	\$5,806.31	10.12	\$5,789.15	10.52	\$6,017.97	8.77	\$5,016.88
PAV020	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL	ML	99.31	8.56	\$850.09	8.53	\$847.11	8.91	\$884.85	7.40	\$734.89
TERRACERIAS											
PAV050	CORTE EN CAJON DE CALLES, EN MATERIAL TIPO "B" F	M3	445.06	65.46	\$29,133.63	65.28	\$29,053.52	97.94	\$43,569.18	62.75	\$27,927.52
PAV060	FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO	M3	0.88	122	\$107.36	121.66	\$107.06	128.91	\$113.44	118.98	\$104.70
PAV070	COMPACTACION DE PLANTILLA CON RODILLO PATA DE	M2	572.05	17.18	\$9,827.82	17.12	\$9,793.50	17.43	\$9,970.83	16.39	\$9,375.90
PAV080	TRATAMIENTO DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CMS DE E	M3	114.41	98.81	\$11,304.85	98.51	\$11,270.53	104.56	\$11,962.71	95.97	\$10,979.93
PAV090	BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR FORMADA	M3	76.78	528.57	\$40,593.60	527.06	\$40,467.67	579.10	\$44,463.30	490.87	\$37,699.00
PAVIMENTOS											
PAV0100A	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	511.84	28.77	\$14,725.64	28.68	\$14,679.57	30.91	\$15,820.97	28.10	\$14,382.70
PAV0121	EXPRESURADO DE BARRIDO DE SUPERFICIE	M2	511.84	1,092.56	\$559,215.91	1,089.41	\$557,603.61	1,225.86	\$627,444.18	935.96	\$479,061.77
PAV0130	BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR DE JANDOLA EXEN	M2	551.98	11.07	\$6,110.42	11.05	\$6,099.38	11.57	\$6,386.41	10.72	\$5,917.23
GUARNICIONES Y DENTELONES											
PAV0140E	FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRET	ML	99.31	511.28	\$50,775.22	509.81	\$50,629.23	565.25	\$56,134.98	428.65	\$42,569.23
PAV0150	RELLENO COMPACTADO ADJUNTO A GUARNICION EN	M3	0.30	148.48	\$44.54	148.05	\$44.42	150.03	\$45.01	127.83	\$38.35
PAV0160	EXCAVACION A MANO Y/O MAQUINARIA PARA DESPLA	M3	0.56	104.92	\$58.76	104.62	\$58.59	110.08	\$61.64	98.46	\$55.14
PAV0170	CUNETAS - DENTELON DE CONCRETO FC=200 KG.	ML	8.00	994.63	\$7,957.04	991.78	\$7,934.24	1,059.94	\$8,479.52	896.22	\$7,169.76
BANQUETAS											
BAN023	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL Y NIVELACION F	M3	24.01	35.20	\$845.15	35.08	\$842.27	35.76	\$858.60	34.04	\$817.30
BAN040B	FABRICACION DE BANQUETA DE DE 8.0 CMS DE ESPES	M2	120.03	515.20	\$61,839.46	513.72	\$61,661.81	556.61	\$66,809.90	466.76	\$56,025.20
BAN098	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO SALAC	PZA	4.00	909.95	\$3,639.80	907.32	\$3,629.28	995.96	\$3,983.84	838.17	\$3,352.68
ACARREOS											
PAV0190	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DE	M3	444.18	58.82	\$26,126.67	58.66	\$26,055.60	60.46	\$26,855.12	57.50	\$25,540.35
PAV0200	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DE	M3-KM	5,330.16	9.04	\$48,184.65	9.02	\$48,078.04	8.93	\$47,599.33	8.84	\$47,118.61
INFRAESTRUCTURA GENERAL											
PAV0440	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA C	TOMA	2.00	3,028.31	\$6,056.62	3,019.59	\$6,039.18	3,140.45	\$6,280.90	2,752.58	\$5,505.16
PAV0400A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIA	DESC.	2.00	4,080.21	\$8,160.42	4,068.46	\$8,136.92	4,296.81	\$8,593.62	3,701.15	\$7,402.30
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO											
MANO DE OBRA											
D040F	TRAZO EN ALINEACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA	ML	90.70	5.97	\$541.48	5.95	\$539.67	6.09	\$552.36	5.34	\$484.34
A020B	EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" CO	M3	131.97	94.32	\$12,447.41	94.03	\$12,409.14	98.70	\$13,025.44	87.87	\$11,596.20
A130A	PLANTILLA APIONADA CON PISON DE MANO EN ZANJA	M3	7.30	135.99	\$992.73	135.60	\$989.88	136.94	\$999.66	112.32	\$819.94
B041D	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 12" DIAM	ML	90.70	93.41	\$8,472.29	93.14	\$8,447.80	95.47	\$8,659.13	83.06	\$7,533.54
A131K	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL "A" Y/O "B" PROD	M3	120.27	359.43	\$43,228.65	358.38	\$43,102.36	421.57	\$50,702.22	328.42	\$39,499.07
C081D	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE P	POZO	1.00	15,492.24	\$15,492.24	15,447.66	\$15,447.66	16,180.56	\$16,180.56	13,952.80	\$13,952.80
C081E	SUMINISTRO, CARGA, ACARREOS Y COLOCACION DE P	POZO	2.00	16,757.59	\$33,515.18	16,709.38	\$33,418.76	17,922.56	\$35,845.12	15,389.87	\$30,779.74
FP002	INCREMENTO AL POZO DE VISITA POR CADA 25 CMS. D	INCR	2.00	2,325.58	\$4,651.16	2,318.89	\$4,637.78	2,326.51	\$4,653.02	2,210.07	\$4,420.14
PAV0379E	COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL	JUEGO	3.00	2,057.06	\$6,171.18	2,051.15	\$6,153.45	2,188.68	\$6,566.04	1,928.61	\$5,785.83
PAV0380	SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIAS, CAJAS Y	SONDEO	10.00	932.06	\$9,320.60	929.38	\$9,293.80	982.59	\$9,825.90	903.20	\$9,032.00
MATERIALES											
H021D	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 12" DE DI	ML	90.70	1,118.38	\$101,437.07	1,115.17	\$101,145.92	1,211.82	\$109,912.07	1,093.42	\$99,173.19
H034E	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL P	PZA	3.00	3,642.70	\$10,928.10	3,632.21	\$10,896.63	4,102.53	\$12,307.59	3,561.43	\$10,684.29
ACARREOS											
J110D	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y	M3	4.40	58.82	\$258.81	58.66	\$258.10	60.46	\$266.02	57.50	\$253.00
J110E	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSEC	M3-KM	52.80	9.04	\$477.31	9.02	\$476.26	8.93	\$471.50	8.84	\$466.75
SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES											
PAV290	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLA	ML	36.00	20.34	\$732.24	20.29	\$730.44	22.36	\$804.96	18.85	\$678.60
PAV0300	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLA	ML	91.31	20.34	\$1,857.25	20.29	\$1,852.63	22.36	\$2,041.69	18.85	\$1,721.19
PAV0360	ENTABLAJE DE BARRILES EN LOS KILOMETROS SUBSEC	M2	13.20	196.34	\$2,591.69	195.77	\$2,584.16	224.52	\$2,963.66	184.91	\$2,440.81

Licitación No. LP-CIDUE-FAIS-OP-41-2021

NOMBRE DE LA OBRA: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre San Pedro y Divisaderos cuerpo poniente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (Folio MIDS 44229); Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre San Pedro y Tepache cuerpo oriente, en la ciudad de Hermosillo, Sonora (Folio MIDS 44390) y Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Leandro P. Gaxiola entre Tepache y Divisaderos cuerpo oriente, en la ciudad de Hermosillo,

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
H055M	SUMINISTRO DE TEE Fo.Fo. 10"x 6" DE DIAMETRO.	PZA	1.00
H054O	SUMINISTRO DE CRUZ Fo.Fo. 6"x 4" DE DIAMETRO.	PZA	1.00
H014G	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT DE Fo.Fo. 10" DE DIAM	PZA	1.00
H014E	SUMINISTRO DE JUNTA GIBAULT DE Fo.Fo. 6" DE DIAME	PZA	4.00
H015D	SUMINISTRO DE JUNTA MECANICA DE 4" DE DIAMETRO	PZA	2.00
H058D1	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. 10" DE DIAMET	PZA.	1.00
H058B	SUMINISTRO DE EXTREMIDAD DE Fo.Fo. 6" DE DIAMETR	PZA.	4.00
H022G	SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE 254 MM	PZA	1.00
H022D	SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE 4" DE I	PZA	2.00
H040B	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MT	PZA.	3.00
H041C	SUMINISTRO DE MARCO Y TAPA DE Fo.Fo. TIPO PESAD	PZA	3.00
H013D	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 4" DE DIAMET	PZA	2.00
H013E	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 6" DE DIAMET	PZA	4.00
H013G	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" DE DIAME	PZA	2.00
H012B	SUMINISTRO DE TORNILLO DE 5/8" X 3"	PZA	16.00
H012C	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2" CON CABE	PZA	32.00
H012D	SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 7/8" X 4" CON CABEZA	PZA	24.00
J155AA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENOS	M3	12.64
J110D	ACARREOS		
J110E	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y DEMO	M3	2.94
	ACARREO DE MATERIAL EN LOS KILOMETROS SUBSEC	M3-KM	35.28
PAV0300	SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES		
PAV0320	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLAN	ML	45.46
PAV0340	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO BLAN	M2	8.80
PAV0210	SEÑALAMIENTOS VERTICAL		
	SUMINISTRO E INSTALACION, EN SEÑAL RESTRICTIVA (PZA	1.00
44420 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO P. GAXIOLA ENTRE TEPACHE Y DIVISADEROS CUERPO ORIENTE, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, S			
PAV010	PRELIMINARES		
PAV010	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL	M2	281.18
PAV020	TRAZO Y NIVELACION PARA ALINEACION HORIZONTAL	ML	49.85
PAV050	TERRACERIAS		
PAV070	CORTE EN CAJON DE CALLES, EN MATERIAL TIPO "B" F	M3	218.76
PAV080	COMPACTACION DE PLANTILLA CON RODILLO PATA DE	M2	281.18
PAV090	TRATAMIENTO DE CAPA SUBRASANTE DE 20 CMS DE E	M3	56.24
PAV0100	BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR FORMADA	M3	37.74
PAV0100	PAVIMENTOS		
PAV0100	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	251.58
PAV0121	ESPESOR DE SUPERFICIE DE 2.5 CM CON BARRIDO	M2	251.58
PAV0130	BARRIDO DE SUPERFICIE A TRATAR DEJANDOLA EXEN	M2	271.32
PAV040E	GUARNICIONES Y DENTELLONES		
PAV040E	FABRICACION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRET	ML	49.85
PAV0450	RELLENO COMPACTADO ADJUNTO A GUARNICION EN	M3	0.15
PAV0460	EXCAVACION A MANO Y/O MAQUINARIA PARA DESPLA	M3	0.28
BAN023	BANQUETAS		
BAN040B	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL Y NIVELACION F	M3	12.08
BAN098	FABRICACION DE BANQUETA DE 80 CMS DE ESPES	M2	60.39
PAV0206	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO S/A/C	PZA	2.00
PAV0206	ACARREOS		
PAV0206	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DE	M3	218.76
	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O DE	M3-KM	2,625.12
INFRAESTRUCTURA GENERAL			

\$2,464,144.06
PRESUPUESTO
BASE

\$2,457,128.67
MURRIETA SOLUCIONES, S.A
DE C.V.

\$2,727,751.03
OTATE SS, S.A. DE C.V.

\$2,213,564.91
GM SUPERPAVE, S.A. DE
C.V.

P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
11,664.98	\$11,664.98	13,128.09	\$13,128.09	10,746.79	\$10,746.79	10,746.79	\$10,746.79
5,815.53	\$5,815.53	9,341.15	\$9,341.15	5,685.81	\$5,685.81	5,685.81	\$5,685.81
683.81	\$683.81	820.50	\$820.50	668.55	\$668.55	668.55	\$668.55
304.20	\$1,216.80	435.50	\$1,742.00	297.40	\$1,189.60	297.40	\$1,189.60
504.86	\$1,009.72	583.18	\$1,166.36	493.60	\$987.20	493.60	\$987.20
4,473.50	\$4,473.50	5,427.97	\$5,427.97	4,373.69	\$4,373.69	4,373.69	\$4,373.69
1,271.74	\$5,096.96	2,082.82	\$8,331.28	1,243.38	\$4,973.52	1,243.38	\$4,973.52
13,829.48	\$13,829.48	14,327.29	\$14,327.29	10,746.79	\$10,746.79	10,746.79	\$10,746.79
3,982.66	\$7,965.32	5,017.71	\$10,035.42	3,436.48	\$6,872.96	3,436.48	\$6,872.96
1,872.47	\$5,617.41	2,209.05	\$6,627.15	1,830.71	\$5,492.13	1,830.71	\$5,492.13
4,473.50	\$13,420.50	4,771.55	\$14,314.65	4,373.69	\$13,121.07	4,373.69	\$13,121.07
113.12	\$226.24	157.79	\$315.58	110.59	\$221.18	110.59	\$221.18
113.12	\$452.48	157.79	\$451.16	110.59	\$442.36	110.59	\$442.36
368.10	\$736.20	441.80	\$883.60	359.90	\$719.80	359.90	\$719.80
33.77	\$541.92	37.62	\$601.92	33.12	\$529.92	33.12	\$529.92
43.14	\$1,384.64	46.08	\$1,474.56	42.30	\$1,353.60	42.30	\$1,353.60
80.93	\$1,947.84	82.93	\$1,990.32	79.35	\$1,904.40	79.35	\$1,904.40
184.05	\$2,326.39	242.37	\$3,106.36	179.94	\$2,274.44	179.94	\$2,274.44
58.82	\$172.93	60.46	\$177.75	57.50	\$169.05	57.50	\$169.05
9.04	\$318.93	8.93	\$315.05	8.84	\$311.88	8.84	\$311.88
20.34	\$924.66	22.36	\$1,016.49	18.85	\$856.92	18.85	\$856.92
196.34	\$1,727.79	224.52	\$1,975.78	184.91	\$1,627.21	184.91	\$1,627.21
252.83	\$252.83	294.70	\$294.70	239.98	\$239.98	239.98	\$239.98
2,502.57	\$2,502.57	2,981.59	\$2,981.59	2,425.31	\$2,425.31	2,425.31	\$2,425.31
10.15	\$2,853.98	10.52	\$2,958.01	8.77	\$2,465.95	8.77	\$2,465.95
8.56	\$426.72	8.91	\$444.16	7.40	\$368.89	7.40	\$368.89
65.46	\$14,320.03	97.94	\$21,425.35	62.75	\$13,727.19	62.75	\$13,727.19
17.18	\$4,830.67	17.43	\$4,900.97	16.39	\$4,608.54	16.39	\$4,608.54
98.81	\$5,557.07	104.56	\$5,880.45	95.97	\$5,397.95	95.97	\$5,397.95
528.57	\$19,948.23	579.10	\$21,855.23	490.87	\$18,525.43	490.87	\$18,525.43
28.77	\$7,237.96	30.91	\$7,776.34	28.10	\$7,069.40	28.10	\$7,069.40
1,092.56	\$274,866.24	1,225.86	\$308,401.86	935.96	\$235,468.82	935.96	\$235,468.82
11.07	\$3,003.51	11.57	\$3,199.17	10.72	\$2,908.55	10.72	\$2,908.55
511.28	\$25,437.31	565.25	\$28,177.71	428.65	\$21,368.20	428.65	\$21,368.20
148.48	\$22.21	150.03	\$22.50	127.83	\$19.17	127.83	\$19.17
104.92	\$29.38	110.08	\$30.82	98.46	\$27.57	98.46	\$27.57
35.20	\$425.22	35.76	\$431.98	34.04	\$411.20	34.04	\$411.20
515.20	\$31,112.93	556.61	\$33,613.68	466.76	\$28,187.64	466.76	\$28,187.64
909.95	\$1,819.90	995.96	\$1,991.92	838.17	\$1,676.34	838.17	\$1,676.34
58.82	\$12,867.46	60.46	\$13,262.23	57.50	\$12,578.70	57.50	\$12,578.70
9.04	\$23,731.08	8.93	\$23,442.32	8.84	\$23,206.06	8.84	\$23,206.06

